



Inženýrské sítě – Ulice Nad Slunečnou, Lety

Název stavby: „Ulice Nad Slunečnou – Inženýrské sítě“


**Objednatel: Obec Lety, Na Návsi 160, 252 29 Dobřichovice
IČ: 00241393, DIČ: CZ00241393
zastoupený: paní Ing. Barborou Tesařovou, starostkou obce**

**Zhotovitel: STURMBAU s.r.o., Pražská 1699/32a, 350 02 Cheb,
IČ: 05689376, DIČ: CZ05689376
zastoupený: Dušanem Šturmlem, jednatelem**

Harmonogram:

- | | | |
|--|---------------------|------------------|
| • Vodovod a Kanalizace | zahájení 16.10.2023 | dokončení 4/2024 |
| • Veškeré zemní práce včetně přípravy VO | zahájení 10/2023 | dokončení 6/2024 |
| • Provizorní povrch komunikace | zahájení 4/2024 | dokončení 6/2024 |
| • Finální pokládka dlažby | zahájení 4/2025 | dokončení 6/2025 |
| • Veřejné osvětlení | zahájení 4/2025 | dokončení 6/2025 |

Situace stavby

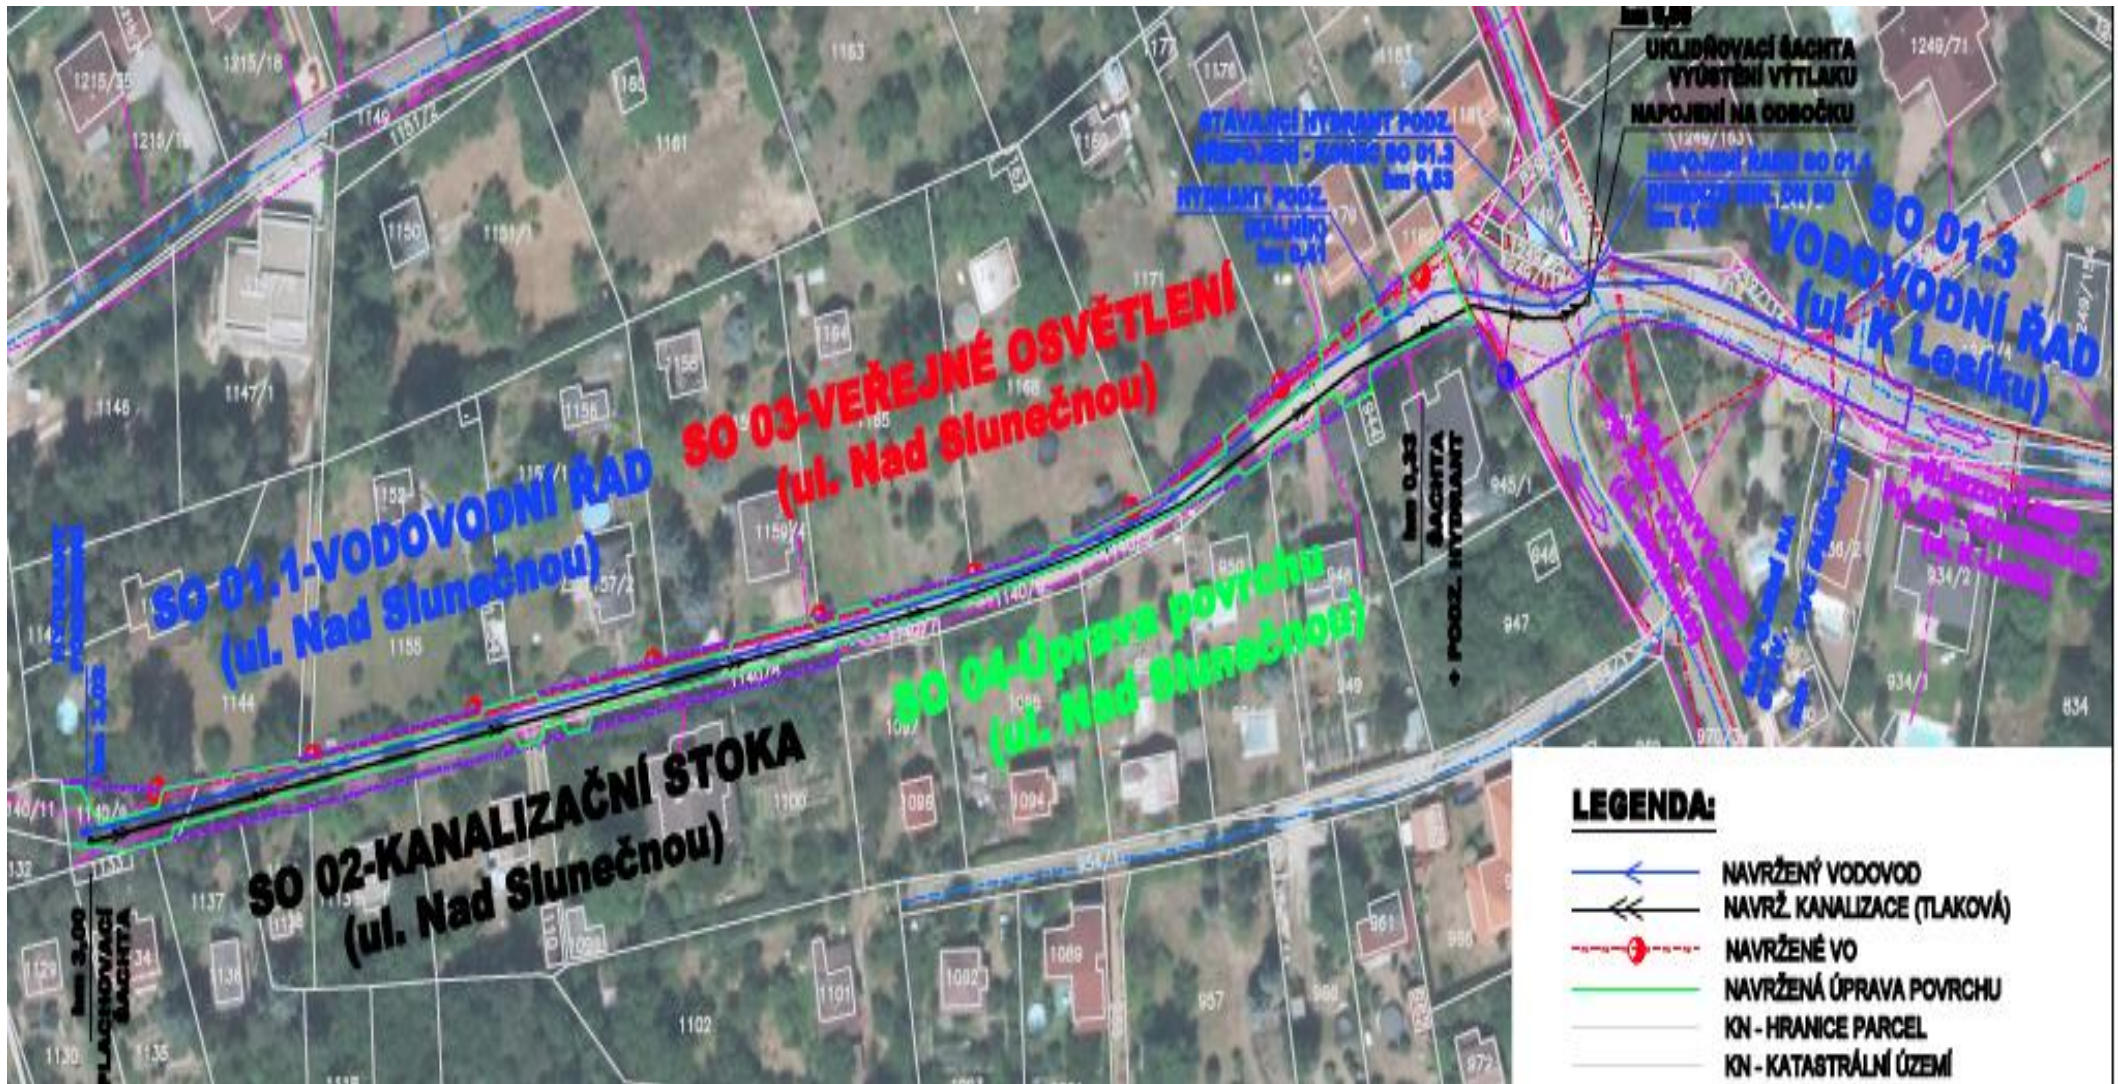

Postup prací:

- **Odstranění podkladů vozovky do hloubky 420 mm v celé šíři nové komunikace (postupně dle pokládky kanalizace a vodovodu). Po odtěžení bude vybudován provizorní chodník ze štěrkového lože**
- **Vybudování proplachovací šachty kanalizace**
- **Pokládka vodovodu (hydrant včetně šoupěte)**
- **Výkop rýhy pro pokládku kanalizace a vodovodu (postupně po etapách, včetně zásypu rýh a zhutnění)**
- **Výstavba VO (příprava na sloupy, elektrorozvod včetně zemnění)**
- **Propojení kanalizace a vodovodu na stávající řady**
- **Pokládka obrub komunikace**
- **Pokládka podkladů komunikace**
- **Pokládka retenční dlažby**
- **Dokončení prací, úklid stavby a předání staveniště**
